



Правительство Кировской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» итоги за 2024 год



Ответственный исполнитель
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ




ИТОГИ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



■ достигнуты
■ не достигнуты

ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ (млн. рублей)

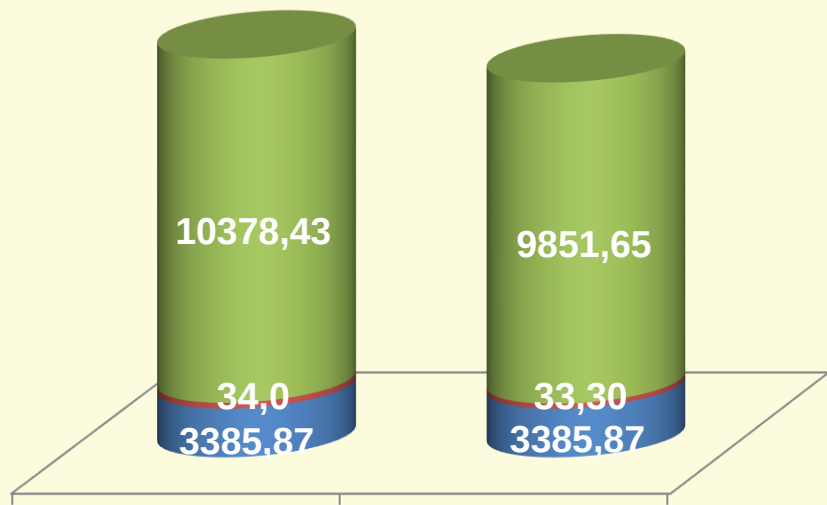

План

Факт

■ Федеральный бюджет ■ Местный бюджет
■ Областной бюджет



Основные цели и показатели реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2024 году

снижение доли
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
Кировской области
регионального или
межмуниципального
значения, не
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортно-
эксплуатационным
показателям, в
общей
протяженности
указанных
автомобильных
дорог до **40%** к 2030
году.

На достижение данной цели направлен
показатель

«Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования Кировской области
регионального или межмуниципального значения,
не соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в
общей протяженности указанных автомобильных
дорог»

на конец 2024 года данный показатель имеет
значение **47,48 %**

процент его достижения составил **91,62 %**



Основные цели и показатели реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2024 году

увеличение
количества
пассажиров,
перевезенных
всеми видами
транспорта, к
2030 году до

104,62 млн.
человек.

На достижение данной цели направлен показатель

«Количество пассажиров, перевезенных всеми видами
транспорта за период реализации государственной
программы»

На конец 2024 года показатель имеет значение **104,7 %**

процент его достижения составил **106,17 %**



Основные цели и показатели реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2024 году

снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, к 2030 году по отношению к уровню 2022 года до **92%**.

На достижение данной цели направлен показатель

«Количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильных дорогах Кировской области относительно уровня 2022 года»

На конец 2024 года данный показатель имеет значение **79 %**

процент его достижения составил **124,05 %**



Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области и показателей ее структурных элементов.

показатели государственной программы «Развитие транспортной системы», запланированные к достижению на 2024 год

Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта за период реализации государственной программы

достигнут
104,7%

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств

достигнут
2,83 %

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

достигнут
52,52 %

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

достигнут
86,22 %

Количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильных дорогах Кировской области относительно уровня 2022 года

достигнут
79 %

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог

не достигнут
47,48 %



Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области»

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя в 2024 году	
		План	Факт
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	52,48	52,52
Протяженность автомобильных дорог Кировской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	км	1 347,660	1 378,051
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	85	86,22
Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	км	684,519	698,13
Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации	км	809,663	809,663
Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	%	76,23	76,26
	км	886,806	887,084
Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	Тыс. Пог.м	1,5691	2,0169
Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	%	29,5054	29,5054
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	75,0	100
Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось	%	0,9636	0,9636
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	52,48	52,52

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ

111 шт.
(в т.ч. 5 мостов)

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

125,6 км/
975,7 пог. м

С ПОКРЫТИЯ

1,04 млн. м²

КАССА

4 894,4 млн. руб. (100%)



Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области»



В 2024 году завершена разработка проектной документации и заключен муниципальный контракт на строительство объекта **«Транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по ул. Советской Нововятского района города Кирова, Кировской области»** на сумму 6 млрд. рублей.



В настоящее время ведутся подготовительные работы, в том числе выкуп и изъятие земель и недвижимого имущества на них, подготовка к переносу сетей (электроснабжения, связи, газоснабжения, канализации, «РЖД»).




Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области»



В 2024 году начаты работы по восстановлению стратегической дороги на северо-запад области.


В рамках исполнения контракта на реконструкцию участка **Вазюк – Опарино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск** в 2024 году выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью **7,5 км** (из 25,46 км) на сумму 350 млн. рублей.

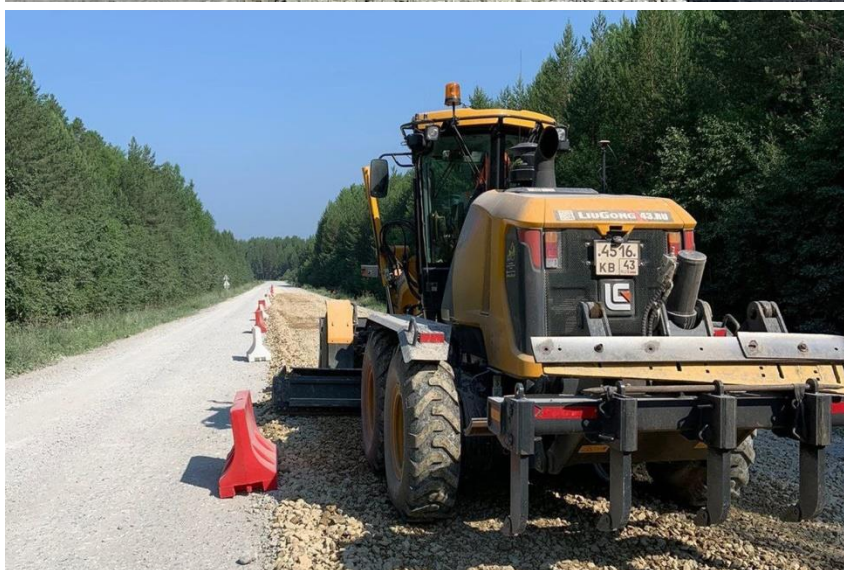




Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области»

Количество размещенных комплексов фиксации нарушений ПДД

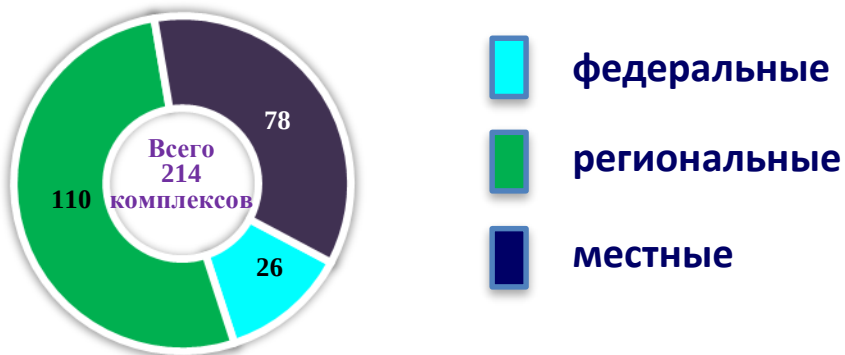

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2024 году:



- приобретено 30 комплексов фотовидеофиксацию,
- размещено 5 АПВГК
- проведены работы по созданию системы обеспечения информационной безопасности в рамках внедрения 3 этапа реализации интеллектуальной транспортной системы Кировской городской агломерации

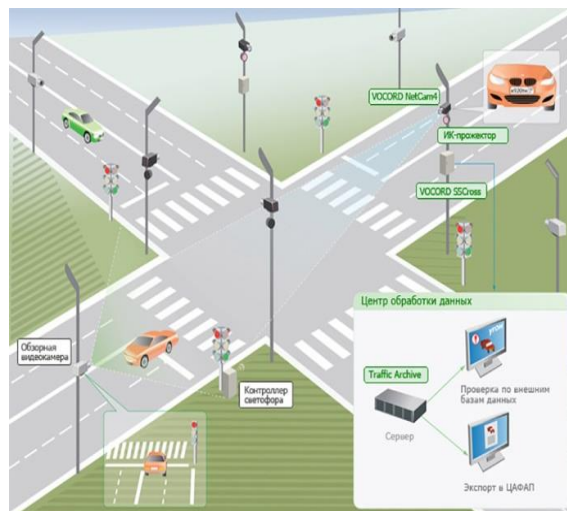



Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Кировской области»

9,959 млн руб. (100%)

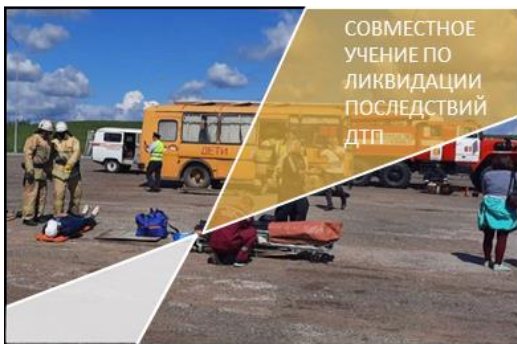

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
		По паспорту	Факт
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	чел.	13,1	11,77
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	чел.	3,13	2,83
Справочно: всего погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	148	134



Региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области»



Получено положительное заключение на проектно-сметную документацию госэкспертизы на объекты:

- **Реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров-Советск-Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе**
- **Реконструкция моста через реку Пушма на км 11+233 автомобильной дороги Пинюг - Скрыбино в Подосиновском районе Кировской области**
- **Строительство автомобильной дороги Шаваржаки - граница Республики Марий Эл в Советском районе Кировской области**




Региональный проект «Развитие дорожного хозяйства Кировской области»



Получено положительное заключение на проектно-сметную документацию госэкспертизы на объекты:

- **Строительство автомобильной дороги Уржум - Буйское - граница Республики Марий Эл, участок Буйское - граница Республики Марий Эл в Уржумском районе**
- **Реконструкция автомобильной дороги Криуша-Советск-Лебяжье-Вершинята, на участке км 54+600 - км 60+100, в Лебяжском районе Кировской области**
- **Реконструкция автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг - Скрябино в Кировской области**

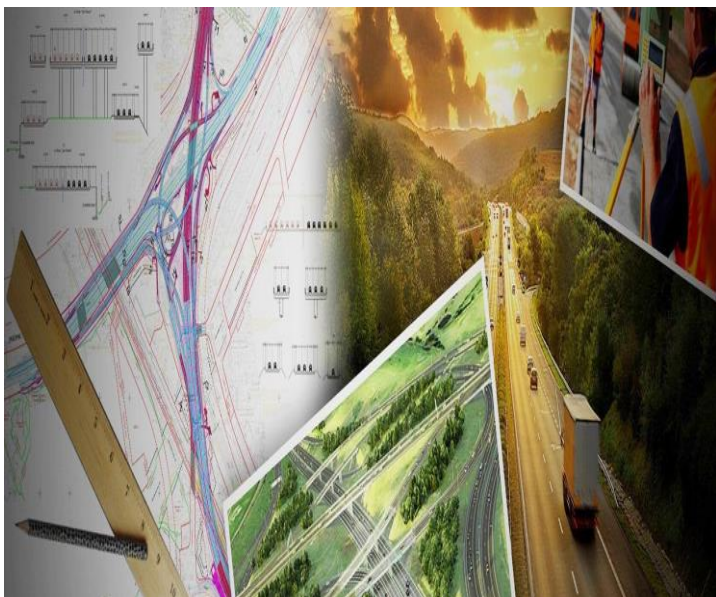



Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области»



ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Субсидии АО «Аэропорт «Победилово»:

- на возмещение части затрат в связи с **осуществлением наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов** в сумме 136,0 млн. рублей. Осуществлено 2084 взлетно-посадочных операций;
- на **восстановление материально-технической базы аэровокзального комплекса в аэропорту Киров (Победилово)** в сумме 203,7 млн. рублей. Отремонтировано 1902 кв. метра помещений аэровокзального комплекса.

Российским организациям воздушного транспорта на возмещение части затрат на осуществление ими **региональных воздушных перевозок** в период в сумме 64,2 млн. рублей. Заключено 3 договора с авиаперевозчиками.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

В целях снижения размера оплаты за проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, компаниям – перевозчикам из областного бюджета субсидии на возмещение им части недополученных доходов в сумме 354,1 млн. рублей. Перевезено железнодорожным транспортом пригородного сообщения 2,99 млн. человек.





Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области»

Льготный проезд в Кировской области

Компенсация расходов перевозчикам за предоставление **льготного проезда** в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения, автомобильном транспорте пригородного сообщения для отдельных категорий граждан в сумме 56,9 млн. рублей. Перевезено пассажиров, имеющих право на льготный проезд 5,03 млн. человек

Кроме того, на **бесплатный проезд членов семей военнослужащих** на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области направлено 28,3 млн. рублей. Перевезено участников специальной военной операции и членов их семей 206,1 тыс. человек

Предоставление субсидий АО «КировПассажирАвтотранс»:


- на **ремонт здания автовокзала в городе Кирове** и благоустройство прилегающей к нему территории в сумме 69,3 млн. рублей, отремонтировано 772 кв. метра;
- на **осуществление организованной перевозки граждан в период проведения специальной военной операции** в сумме 11,4 млн. рублей. Для осуществления организованной перевозки граждан выполнено 957 рейсов.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ





Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий развития в сфере транспорта Кировской области»

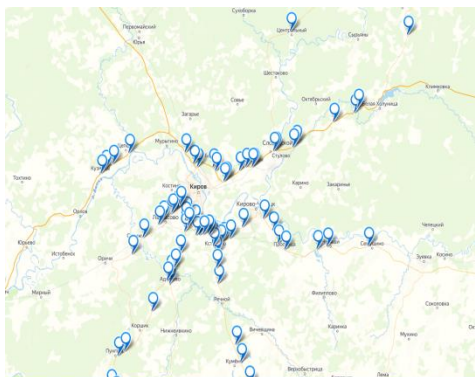

В целях развития системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 2024 году обеспечена работа 214 комплексов.

В рамках субсидии КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» на государственное задание выделено 74,7 млн. рублей.



В рамках комплекса процессных мероприятий обеспечена деятельность министерства транспорта Кировской области в размере 45,4 млн. рублей



Министерством транспорта Кировской области осуществляется региональный государственный контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в пределах установленной штатной численности и в рамках текущего финансирования деятельности министерства



Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах»



в рамках субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения произведён ремонт **2,4** км дорожного полотна



в рамках субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием произведен ремонт **17,5** км дорожного полотна

в рамках субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автодорог произведен ремонт **94,8** км дорожного полотна



Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах»



осуществлено содержание автомобильных
дорог регионального
или межмуниципального значения
протяженностью **2623,801** км
и искусственных сооружений на них,

что обеспечило качественный
бесперебойный проезд по автомобильным
дорогам общего пользования Кировской
области регионального или
межмуниципального значения

проведены работы по капитальному
ремонту **0,560** км дорог;

14 водопропускных труб отремонтировано
и принято в эксплуатацию.





Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в отчетном году.



На реализацию мероприятий Государственной программы в 2024 году предусмотрено
13 798 337,74 тыс. рублей, из них средств из:

Федерального	Областного	Местного
3 385 868,35 тыс. рублей (24,54%)	10 378 426,90 тыс. рублей (75,21%)	34 042,49 тыс. рублей (0,25%)

За 2024 год на реализацию мероприятий государственной программы направлено
13 270 814,78 тыс. рублей или **98,18%** годовых плановых расходов в том числе из:



Федерального	Областного	Местного
3 385 868,35 тыс. рублей (100%)	9 851 648,86 тыс. руб. (94,92%)	33 297,57 тыс. рублей (97,81%)
